



Autores:	Data de Criação: 30/08/2025
Matheus Duarte da Silva - 211062277	Última Atualização: 14/11/2025

Documento de Descrição do Processo de Gerenciamento de Projeto

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO

Este é um documento referente ao projeto da matéria de Engenharia de Software (CIC0105), que tem como foco a criação de um produto para auxiliar na aplicação da metodologia Scrum no processo de desenvolvimento de software denominado “Sistema Scrum”.

INFORMAÇÕES SOBRE ESSE DOCUMENTO

Este documento, Gerenciamento de Projeto, visa descrever as atividades e metodologias utilizadas pela equipe para organizar, acompanhar e realizar o desenvolvimento do projeto “Sistema Scrum”. O seu objetivo é prover transparência sobre o trabalho, o método de organização de tarefas (Kanban) e a estrutura de comunicação da equipe, garantindo o alinhamento entre todos os membros.

Quadro 01 - Nome dos Integrantes do Grupo e Matrícula

Nome	Matrícula
Gabriel Francisco de Oliveira Castro	202066571
Lucas Issamu Hashimoto	231003504
Pedro Vale de Souza	231038733
Matheus Duarte da Silva	211062277
Suyanne Sara Miranda Silva	222006445

Fonte: Do Autor



HISTÓRICO DE REVISÃO

Esse trecho contém todo o histórico de revisão e mudanças nesse documento, para garantir um controle e um rastreio da evolução do documento.

Quadro 02 - Histórico de Revisão

Data	Autor	Descrição	Versão
30/08/2025	Matheus Duarte da Silva	Criação do documento	v0.1.0
10/10/2025	Matheus Duarte da Silva	Atualização do documento	v0.2.0
13/11/2025	Matheus Duarte da Silva	Atualização do documento	v1.0.0
14/11/2025	Suyanne Sara Miranda Silva	Adição de informação	v2.0.0

Fonte: Do Autor

1. ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO

As atividades de gerenciamento da equipe são descritas:

1.1 Reuniões


O processo de gerenciamento da equipe foi embasado em reuniões. Fizemos tanto reuniões online como presenciais e utilizamos meios de comunicação escrita, como mensagens via Whatsapp e Discord.

Nossas reuniões online se deram principalmente por meio da plataforma Discord. A ideia principal desses encontros era realizar um alinhamento das ideias de cada um, verificando a interpretação de cada integrante acerca do projeto e suas responsabilidades.

Por meio das reuniões, definíamos as próximas atividades a serem desenvolvidas e separávamos responsabilidades entre os membros conforme o andamento do projeto. Essas reuniões serviam, também, como um meio para a tomada de decisões. As atividades e requisitos discutidos eram então "traduzidos" em itens de trabalho, colocados no backlog do quadro Kanban da equipe, garantindo que o planejamento verbal fosse transformado em algo mais visualizável e factível, mantendo registro de informação.

Para solucionar a questão de tempo disponível de cada integrante e maximizar a participação, a equipe adotou a ferramenta [When2Meet](#). Conforme, a figura 01, vemos que o site permitia que cada integrante marcasse seus horários livres, gerando um mapa visual que destaca os blocos de maior disponibilidade comum, facilitando a marcação de reuniões.

Figura 01: Exemplo de disponibilidade verificada via When2Meet.

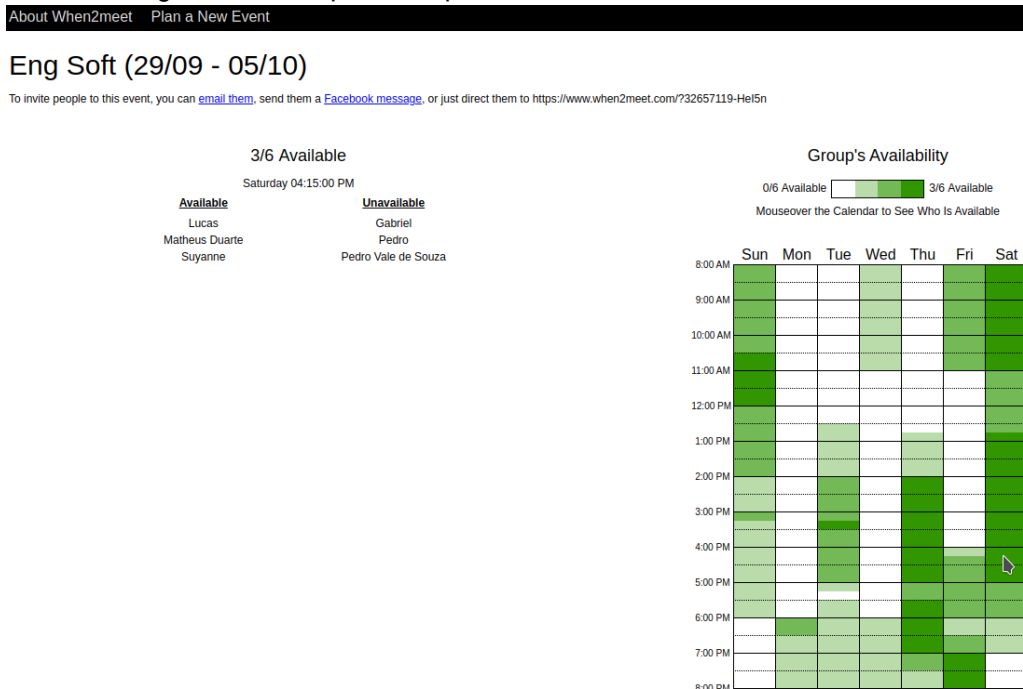

1.2 Organização e Gerenciamento em Sub-equipes

Uma das atividades de gerenciamento cruciais foi realizada no início do projeto. Definimos subequipes para trabalhar com as partes do sistema. As equipes montadas foram:



- **Subequipe Backend:** Pedro Vale, Lucas Issamu e Gabriel Francisco
Subequipe Frontend: Suyanne Miranda e Matheus Duarte

As responsabilidades da subequipe Backend eram todos os itens necessários ao funcionamento da API, desde o banco de dados até as rotas em Python.

As responsabilidades da subequipe Frontend eram a construção da interface no Figma, dos storyboards, wireframes e a codificação do protótipo frontend, conectando-se com a API.

1.3 Revisão de Código e de Documentos

Adotamos um processo iterativo de construção do código e dos documentos necessários à especificação do trabalho.

Nossas tarefas eram materializadas via Pull Requests (PR) no GitHub, e definimos a seguinte regra de revisão:

- Pelo menos um membro da outra subequipe deve revisar o Pull Request.
- Pelo menos um membro da mesma subequipe deve revisar o Pull Request.

Os nossos PRs eram mergeados após aprovação segundo essa regra.

Adotamos revisão, também, para os documentos requeridos na especificação do trabalho e necessários à construção do sistema. Cada artefato deveria ser revisado por pelo menos dois (2) membros da equipe, excluindo-se aquele que o construiu. Após aprovadas as alterações, o documento tornava-se uma nova versão registrada no topo do arquivo por meio da tabela "Histórico de Revisão".

2. Quadro Kanban

Para o gerenciamento das tarefas de desenvolvimento e documentação, a equipe adotou o método Kanban, por conta do auxílio visual do progresso e da gestão de fluxo de trabalho. A plataforma escolhida para utilizar o quadro foi o GitHub Projects. Pois o GitHub já possui integração de projetos com repositórios, que permitiu associar diretamente as tarefas (cartões) aos commits e pull requests do repositório, centralizando todo o ciclo de vida do desenvolvimento em um único lugar.


O quadro foi estruturado com base no fluxo padrão do Kanban, com colunas que representam as etapas do processo de desenvolvimento da equipe. O fluxo segue a ordem:

1. Backlog
2. Em Progresso
3. Pronto para Revisão
4. Em Revisão
5. Finalizado

Além das colunas padrão, foi adicionado a coluna "Rejeitado", criada para guardar tarefas que foram descartadas, duplicadas ou rejeitadas por outro motivo, serve para manter o histórico

A Figura 02 mostra a aparência geral do quadro Kanban utilizado no projeto.

Figura 02: Quadro Kanban do projeto

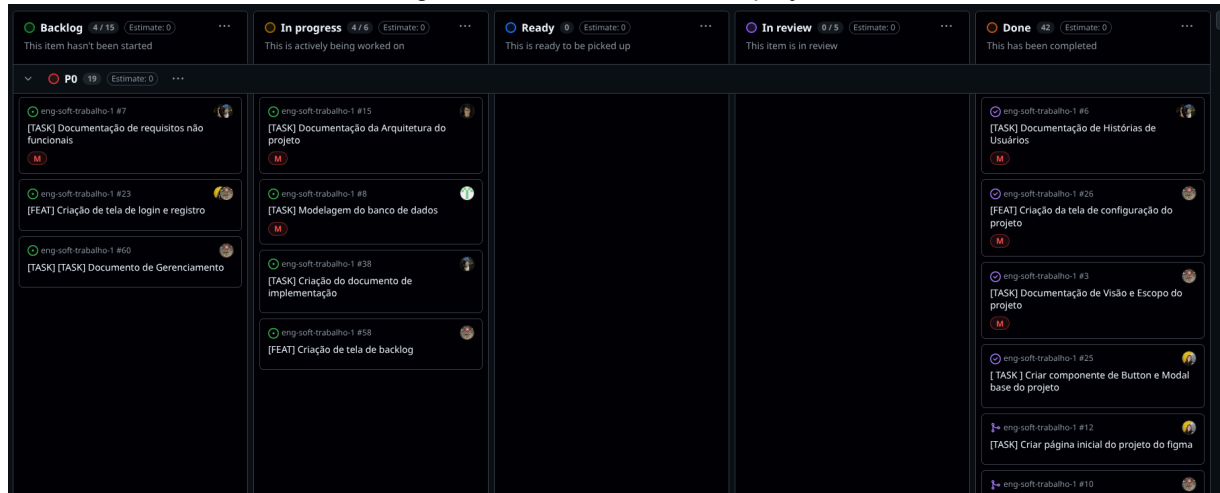

Fonte: Do autor

2.1 Coluna “Backlog”

Essa coluna serve para alocar os itens que deverão ser feitos, como: os documentos necessários para o projeto, algumas atividades de criação de design de tela no Figma, ideias de implementação de parte do programa, basicamente essa coluna serve como o ponto de entrada e de fonte para a realização de atividades do projeto.

Nenhuma atividade era iniciada sem que antes fosse registrada como um cartão no "Backlog". A partir daqui, os membros da equipe "puxavam" as tarefas para iniciar o desenvolvimento

2.2 Coluna “Em Progresso”

Essa coluna tem como objetivo indicar as tarefas que estão sendo ativamente desenvolvidas por um membro da equipe.

Ao mover um cartão para esta coluna, o membro da equipe sinalizava que aquela atividade estava sob sua responsabilidade e em execução. Isso evitava a duplicação de esforços e fornecia transparência sobre o trabalho.

2.3 Coluna “Pronto para Revisão”

Esta coluna funciona como uma "área de espera" para tarefas consideradas finalizadas, mas que ainda aguardam validação por outro membro da equipe.

O objetivo desta etapa é garantir que o trabalho passe por um controle de qualidade, como *Code Review* ou revisão de documentação, antes de ser considerado efetivamente concluído.

2.4 Coluna “Em Revisão”

A tarefa aqui está sob revisão por um membro da equipe que seja diferente daquele que realizou a atividade, é uma parte importante para manter a maior parte dos integrantes por dentro do progresso, pois com a revisão é possível analisar, opinar e decidir o que será feito com o que tem até agora.

A revisão é crucial para manter a qualidade, o alinhamento de ideias e o engajamento da equipe no progresso geral. Após a análise, os cartões desta coluna podem



seguir dois caminhos: se aprovados, são movidos para "Finalizado"; se necessitarem de ajustes, retornam para "Em Progresso" com o feedback correspondente.

2.5 Coluna “Finalizado”

É a etapa final que representa todo o trabalho que foi desenvolvido, revisado e aprovado pela equipe.

Esta coluna serve como um registro permanente de todas as entregas concluídas do projeto. Ela permite que a equipe meça sua velocidade e visualize o progresso ao longo do tempo.

2.6 Coluna “Rejeitado”

Essa coluna foi designada para atividades que no meio do caminho não foram completas ou descartadas e então migradas para outra tarefa que melhor descreve a mesma, ou até mesmo uma tarefa que foi quebrada em várias outras menores, de toda forma ela não é “útil” para o desenvolvimento mas é armazenada ali para mostrar e guardar como um histórico

3. Cartões de Gerenciamento

Os cartões de gerenciamento (ou tasks) são os itens fundamentais de trabalho do método Kanban. Eles representam a fonte de todo o fluxo de desenvolvimento, transformando cada demanda em um item tangível, visível e rastreável.

O objetivo do cartão não é somente nomear uma tarefa, mas informar todo o contexto necessário para que ela seja executada, revisada e entregue. A Figura 03 ilustra a aparência desses cartões na coluna "Finalizado"

Figura 03: Coluna de tarefas finalizadas com seus cartões




Fonte: Do autor

3.1 Informações sobre o cartão

Para garantir que cada tarefa fosse totalmente compreendida e padronizada, a equipe definiu um conjunto de informações que deveriam constar em cada cartão. A Figura 04, que detalha um cartão do projeto serve como um exemplo completo dessa estrutura:

Figura 04: Cartão de Gerenciamento do documento de visão e escopo

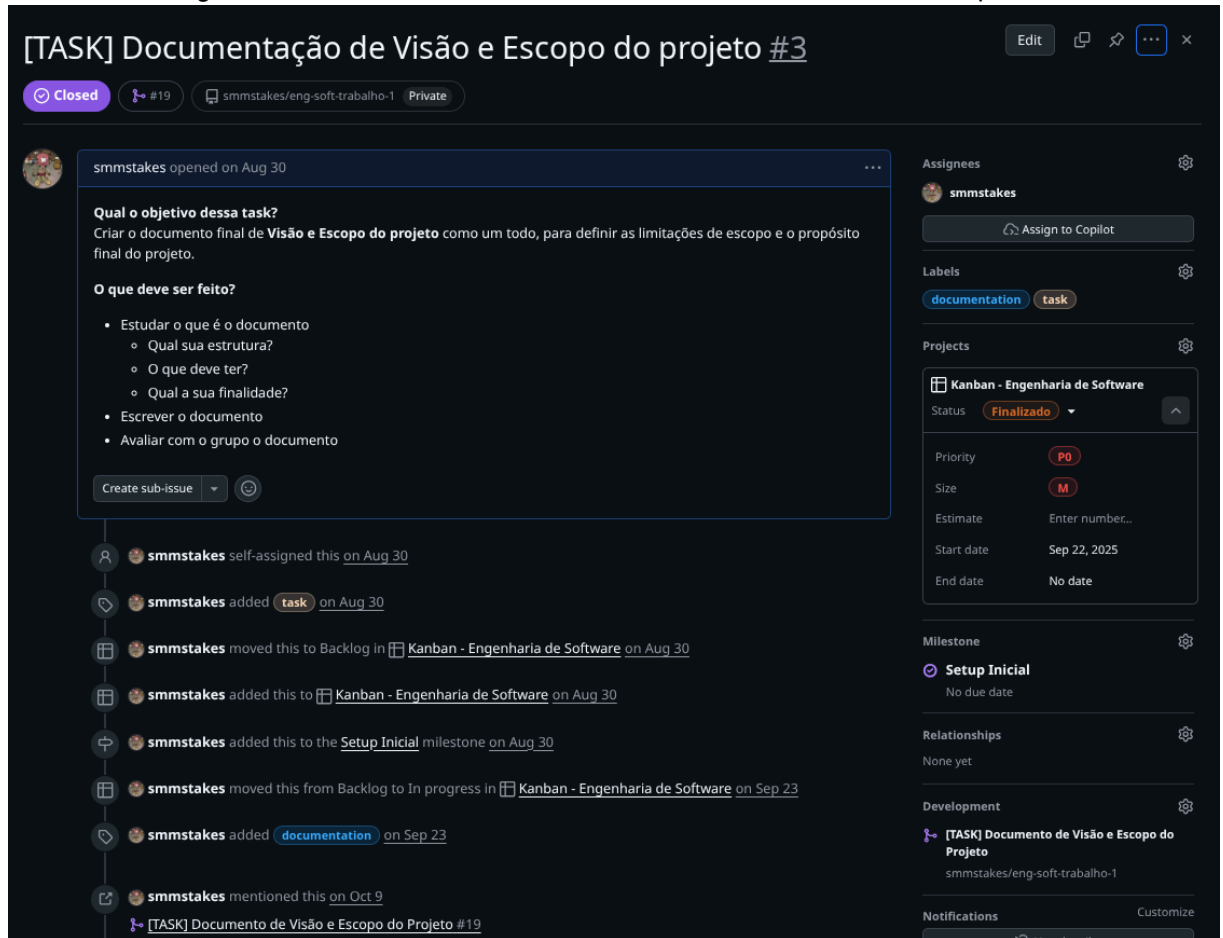

Fonte: Do autor

Nesse cartão é possível ver várias informações importantes, como:

- **Título:** O nome da tarefa, que deve ser breve, mas descritivo o suficiente para que qualquer membro da equipe entenda seu propósito
- **Descrição:** Este é o campo que tenta detalhar melhor o que é proposto para aquela tarefa. Ele foi estruturado para responder a três perguntas:
 - *Qual o objetivo dessa task?* Fornece a justificativa e o valor da tarefa, ou seja, o "porquê" ela está sendo feita.
 - *O que deve ser feito?* Descreve os requisitos de aceitação ou um pequeno plano.
- **Responsáveis:** Indica qual membro da equipe "puxou" a tarefa do Backlog ou Pronto para Revisão e está ativamente trabalhando nela.
- **Labels:** Categoriza o tipo de trabalho, como, documentação, task, bug, feature. Isso ajuda a filtrar o quadro e a entender quais tipos de atividades estão em andamento.



Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciências da Computação

- **Projeto e Status:** São informações de contexto que associam o cartão ao projeto correto e indicam sua coluna atual no fluxo.
- **Prioridade:** Uma classificação de importância. Este campo é útil para a tomada de decisão da equipe, garantindo que os itens mais importantes no Backlog sejam puxados primeiro.
- **Tamanho:** Uma estimativa do esforço ou complexidade da tarefa.
- **Histórico:** Registro automático do GitHub com todas as movimentações e comentários, fornecendo um histórico completo de quando o cartão foi criado, movido entre colunas ou alterado, garantindo total rastreabilidade.
